



Raport z wykonanej pracy

Nr raportu: DM-260801-003

REALIZACJA ZLECENIA · ZDJĘCIA PRZED I PO · POTWIERDZENIE KLIENTA

KLIENT

NAZWA FIRMY

Restauracja Zielony Stół - przykład

NIP

000-000-00-00

ADRES SIEDZIBY

ul. Pokazowa 7, 30-000 Kraków

ADRES WYKONANIA

ul. Pokazowa 7, 30-000 Kraków

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Karolina Testowa

TELEFON

+48 510 300 300

E-MAIL

karolina.testowa@example.com

WYKONAWCA

NAZWA FIRMY

AquaPunkt Instalacje - przykład

ADRES

ul. Modelowa 21, 30-000 Kraków

NIP

000-000-00-00

TELEFON

+48 500 200 200

E-MAIL

biuro@aquapunkt.example

OPIS ZGŁOSZENIA

Nieszczelność połączenia odpływowego pod zlewem zaplecza kuchennego.

REALIZACJA ZLECENIA

Wykonane czynności

Zamknięto dopływ, zdemontowano syfon, oczyszczono gniazda, wymieniono uszczelki i ponownie zmontowano odpływ.

Użyte materiały

Komplet uszczelkek syfonu, taśma PTFE i środek do czyszczenia powierzchni.

Wynik testu lub sprawdzenia


Trzy próby pełnego przepływu i piętnastominutowa próba szczelności bez wycieku.

Zalecenia

Kontrola przestrzeni pod zlewem po 24 godzinach.

ZDJĘCIA PRZED I PO

PRZED

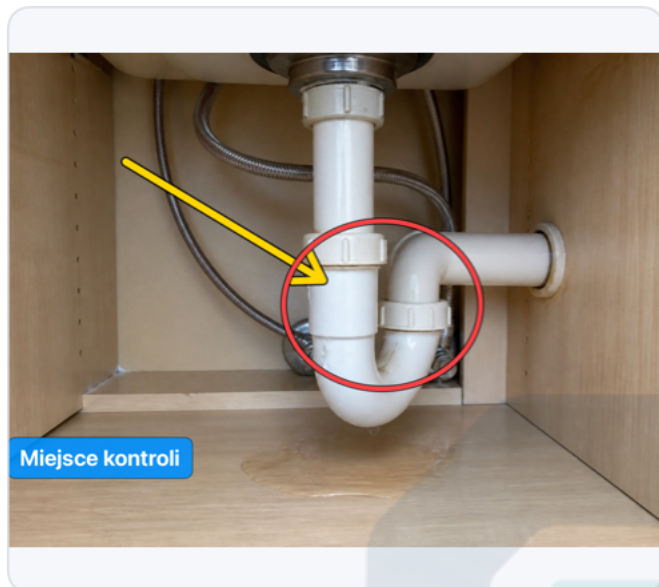

Aparat · 28.05.2026, 22:46 · adnotacje: 3
Stan zastany przed rozpoczęciem prac.


PARA 1

PO



Aparat · 28.05.2026, 22:46 · adnotacje: 3
Efekt po wykonaniu usługi.


PRZED

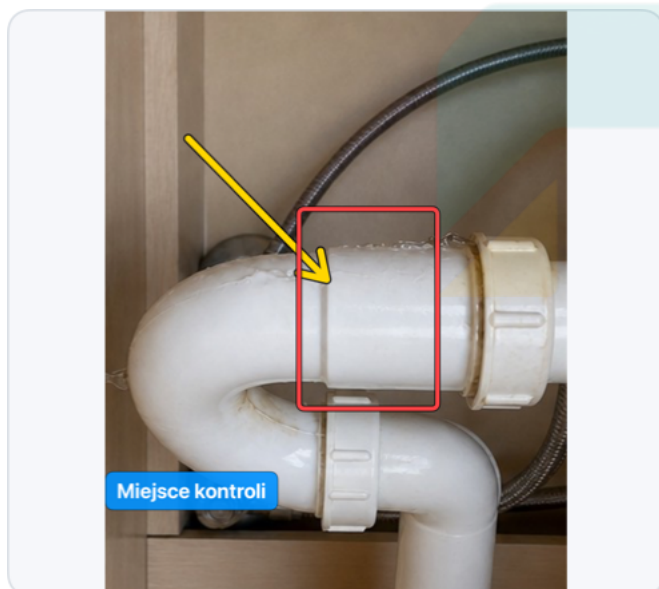

Biblioteka · 28.05.2026, 22:48 · adnotacje: 3
Zbliżenie miejsca wymagającego interwencji.

PARA 2

PO

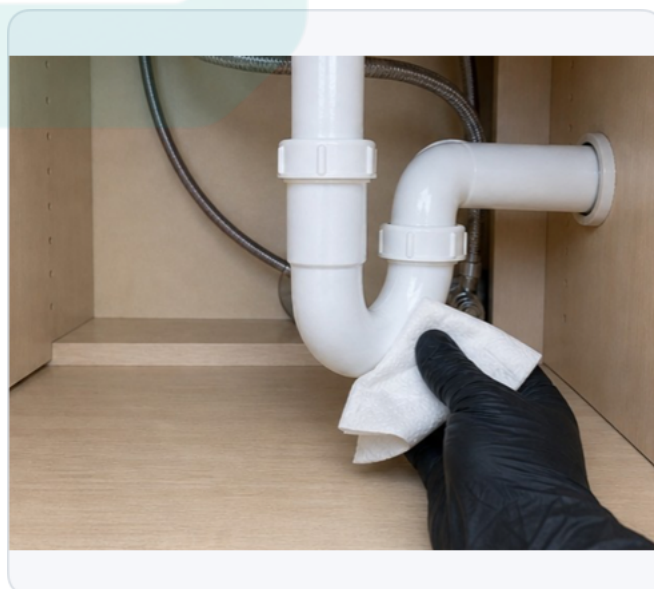


Biblioteka · 28.05.2026, 22:48
Detal po montażu i uporządkowaniu stanowiska.

ZDJĘCIA PRZED I PO - CIĄG DALSZY

PRZED


PARA 3

PO

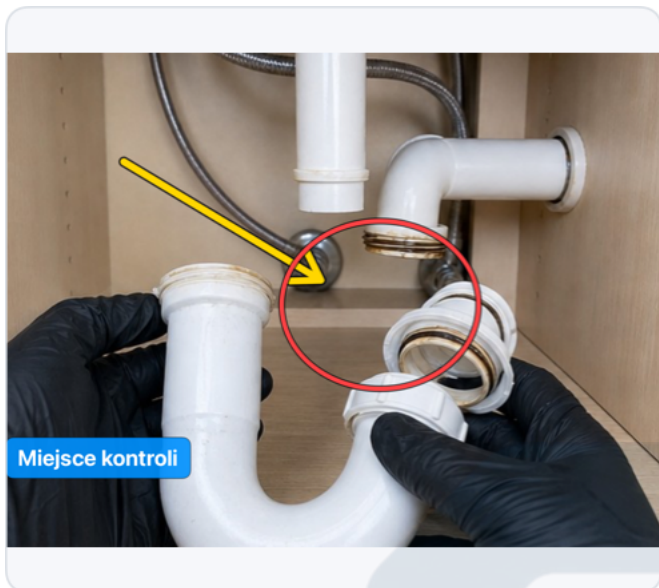

Aparat · 28.05.2026, 22:50 · adnotacje: 3

Diagnoza elementu przed wykonaniem naprawy.

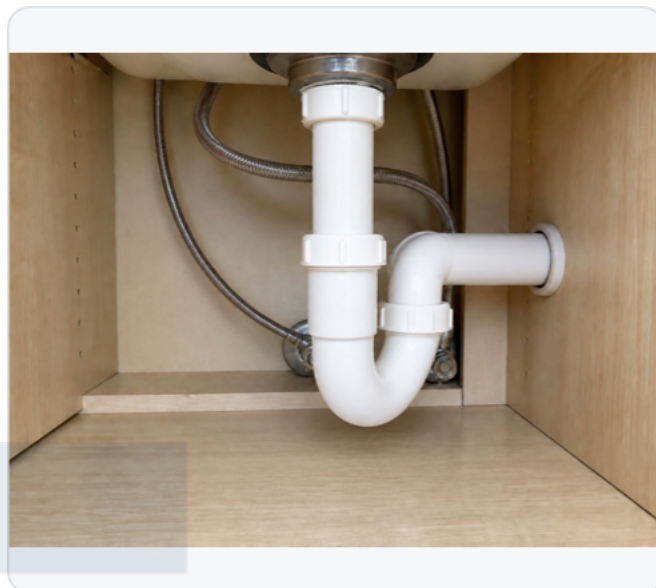

Aparat · 28.05.2026, 22:50

Kontrola końcowa po wykonaniu prac.

POTWIERDZENIE KLIENTA

Status Podpisano
 Osoba Karolina Testowa
 Data 28.05.2026
 Godzina 23:46

PODPIS ODRĘCZNY

[Handwritten signature]
